

公共下水道工事の進捗について

建設環境課
上下水道室

1 工事概要

- ア 工 事 名 公共八橋地区(32-1 工区) 工事
- イ 請負業者 加登脇建設株式会社
- ウ 請負金額 57,530,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
- エ 着 工 日 令和2年9月18日
- オ 工事場所 別紙工事箇所図
- カ 備 考

下水道管布設に支障となる上水道管の布設替及び新設工事も別工事にて行うため、工事箇所図に併記している。

2 進捗状況

国道9号の片側交互通行が必要なため、別紙誘導員配置表のとおり予定していたが、交通誘導員が慢性的な人員不足等のため、確保が困難な状況である。

請負業者は議決後、直ちに鳥取県下全ての警備会社を確認するなど交通誘導員の確保に努めたが、令和3年2月からの誘導員確保が出来たため、現在は現場確認や関係機関等の連絡調整を行っている所である。


3 今後のスケジュール

令和3年1月までに現地測量や材料搬入などを完了し、2月から現場施工に取り掛かる。

工事箇所図

下水道: 公共八橋地区(32-1工区)工事 (L=205.70m)

上水道: 上水道配水管布設替工事(八橋地区R2-1工区)
(L=223.10m)

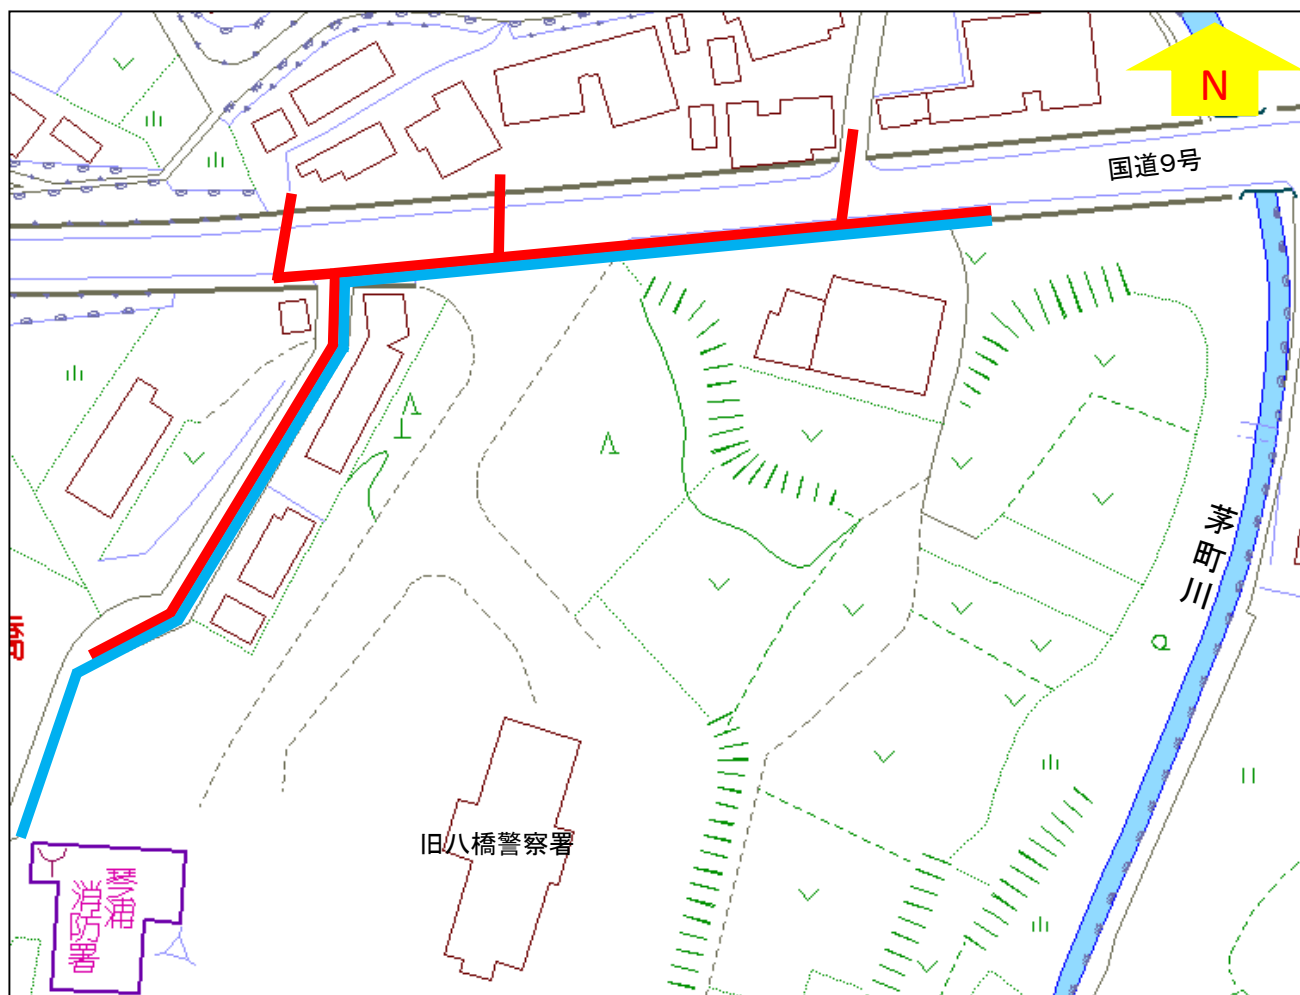

八橋32-1誘導員想定図

歩道内施工時(14人)

●...誘導員

●...徐行員

●...規制車操作

